



13 de Enero de 2023.
OFICIO No. MZP/OP-SRFT4toT22-125

**CHRISTIAN SAMUEL LAVADORES ALVAREZ
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN DE LA SECRETARIA DE BIENESTAR
PRESENTE**

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 78 de la Ley Orgánica Municipal, y para dar cumplimiento a los Lineamientos para informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicados el 25 de abril de 2013 en el Diario Oficial de la Federación; solicito de la manera más atenta, sean revisados y en su caso validados los **folios de las obras** de los Fondos de Aportaciones FISMDF y FORTAMUNDF, que se registraron en los **Módulos de Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto e Indicadores**, a través del Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del Portal del Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), correspondiente al **4to. Informe Trimestral del Ejercicio 2022**.

Anexo al presente en formato impreso, el listado de folios registrados en los módulos Destino del Gasto, Ejercicio del Gasto (plantilla) y formato de Indicadores.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y me reitero a sus órdenes.

ATENTAMENTE

"SIGAMOS CONSTRUYENDO UN MEJOR MUNICIPIO"



Archivo. Control de Gestión.

C. EDUARDO VAZQUEZ MARQUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN, PUEBLA.



PRESIDENTE MUNICIPAL
DE ZAPOTITLAN, PUE.
2021 - 2024

NOMBRE DEL MUNICIPIO
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
CUARTO TRIMESTRE 2022

FISM-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. De OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
PUE22020206972	20942	MZP-2022-02	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE LOS COCOS, ENTRE CALLE LA HUERTA Y CALLE SIN NOMBRE EN LA CABECERA MUNICIPAL DE ZAPOTITLAN, PUEBLA.	ZAPOTITLAN SALINAS	\$ 2,149,041.44	\$ 2,149,041.44	\$ 2,149,041.44	\$ 2,149,041.44	\$ 2,149,041.44	\$ 2,149,041.44	\$ 2,149,041.44	100%	100%	M2	1725.18	TERMINADA
PUE22020207124	30215	MZP-2022-04	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN AVENIDA SAN ANTONIO ENTRE CARRETERA FEDERAL Y CALLE LAS FLORES EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO TEXCALA, MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA, 1ra ETAPA.	SAN ANTONIO TEXCALA	\$ 1,131,584.58	\$ 1,129,860.20	\$ 1,129,860.20	\$ 1,129,860.20	\$ 1,129,860.20	\$ 1,129,860.20	\$ 1,129,860.20	100%	100%	M2	789.67	TERMINADA
PUE22020207486	53281	MZP-2022-09	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ATZUMBA PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA.	SAN PEDRO ATZUMBA	\$ 924,423.04	\$ 921,303.00	\$ 921,303.00	\$ 921,303.00	\$ 921,303.00	\$ 921,303.00	\$ 921,303.00	100%	100%	M2	448.8	TERMINADA
PUE22040215667	223643	MZP-2022-11	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD ESTANZUELA ZAPOTITLAN, PUEBLA	ESTANZUELA	\$ 330,935.09	\$ 330,270.90	\$ 330,270.90	\$ 330,270.90	\$ 330,270.90	\$ 330,270.90	\$ 330,270.90	100%	100%	ML	800	NO MIGRO
PUE220203010997	117075	MZP-2022-12	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARCAMOS DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO HIDALGO, ZAPOTITLAN PUEBLA.	COLONIA HIDALGO	\$ 244,810.92	\$ 244,810.92	\$ 244,810.92	\$ 244,810.92	\$ 244,810.92	\$ 244,810.92	\$ 244,810.92	100%	100%	CARCAMO 2.00	2.00	TERMINADA
PUE22030211009	117353	MZP-2022-12	EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CARCAMOS DE BOMBEO DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE BARRIO HIDALGO ZAPOTITLAN, PUEBLA.	COLONIA HIDALGO	\$ 64,718.33	\$ 64,718.33	\$ 64,718.33	\$ 64,718.33	\$ 64,718.33	\$ 64,718.33	\$ 64,718.33	100%	100%	CARCAMO 2.00	2.00	TERMINADA
PUE22030211723	149600	MZP-2022-13	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES METZONTLA MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PUEBLA.	LOS REYES METZONTLA	\$ 1,209,249.64	\$ 1,208,581.23	\$ 1,208,581.23	\$ 1,208,581.23	\$ 1,208,581.23	\$ 1,208,581.23	\$ 1,208,581.23	100%	100%	M2	443.89	TERMINADA
PUE22030211782	151877	MZP-2022-17	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE NACIONAL ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE EN SAN FRANCISCO XOCHITLPEPEC ZAPOTITLAN PUEBLA.	SAN FRANCISCO XOCHITLPEPEC	\$ 711,057.17	\$ 710,002.49	\$ 710,002.49	\$ 710,002.49	\$ 710,002.49	\$ 710,002.49	\$ 710,002.49	100%	100%	ML	660.8	TERMINADA
PUE22030212977	207655	MZP-2022-14	PANTECON ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CAZAHUATERA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS	ZAPOTITLAN SALINAS	\$ 904,402.71	\$ 903,896.24	\$ 903,896.24	\$ 903,896.24	\$ 903,896.24	\$ 903,896.24	\$ 903,896.24	100%	100%	M2	713.14	TERMINADA
PUE22030212992	208321	MZP-2022-16	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE DEL VERDE ENTRE CALLE DEL CALICANTO Y CALLE SAN JUAN EN LA COLONIA EL PEDREGAL EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA.	ZAPOTITLAN SALINAS	\$ 1,011,439.91	\$ 1,009,854.36	\$ 1,009,854.36	\$ 1,009,854.36	\$ 1,009,854.36	\$ 1,009,854.36	\$ 1,009,854.36	100%	100%	M2	756	TERMINADA
PUE22040215208	163725	MZP-2022-19	REHABILITACION DEL SISTEMA Y TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LAS VENTAS ZAPOTITLAN PUEBLA PRIMERA ETAPA	LAS VENTAS	\$ 321,506.92	\$ 320,754.34	\$ 320,754.34	\$ 320,754.34	\$ 320,754.34	\$ 320,754.34	\$ 320,754.34	100%	100%	M2	22.00	TERMINADA
PUE22040215440	208387	MZP-2022-20	CONSTRUCCION DEL SISTEMA Y TANQUE DE AGUA ENTUBADA DE 20 M3 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DIXIARDO ZAPOTITLAN, PUEBLA PRIMERA ETAPA.	SAN JOSE DIXIARDO	\$ 353,823.39	\$ 344,060.10	\$ 344,060.10	\$ 344,060.10	\$ 344,060.10	\$ 344,060.10	\$ 344,060.10	100%	100%	M2	22.00	TERMINADA
PUE22040215435	207560	MZP-2022-22	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PROLONGACION DE LA CALLE DE LOS DEPORTES DE SAN ANTONIO, TEXCALA, ZAPOTITLAN, PUEBLA.	SAN ANTONIO TEXCALA	\$ 999,815.51	\$ 995,146.02	\$ 995,146.02	\$ 995,146.02	\$ 995,146.02	\$ 995,146.02	\$ 995,146.02	100%	100%	ML	349.59	TERMINADA
PUE22040216148	248562	MZP-2022-24	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA EL PEDREGAL EN ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA.	ZAPOTITLAN SALINAS	\$ 1,300,942.16	\$ 1,296,690.45	\$ 1,296,690.45	\$ 1,296,690.45	\$ 1,296,690.45	\$ 1,296,690.45	\$ 1,296,690.45	100%	100%	ML	660.67	TERMINADA
PUE22040216403	262182	MZP-2022-27	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 30 M3 EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO NETITLAN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA.	SAN PABLO NETITLAN	\$ 303,473.62	\$ 302,110.72	\$ 302,110.72	\$ 302,110.72	\$ 302,110.72	\$ 302,110.72	\$ 302,110.72	100%	100%	TANQUE	1.00	TERMINADA
PUE22040216411	262493	MZP-2022-28	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION EN LA PIROLONGACION DE LA CALLE FRESNOS ENTRE CALLE FRESNOS Y CARRETERA ATECOXCO SAN PEDRO ATZUMBA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NETITLAN, ZAPOTITLAN, PUEBLA.	SAN PEDRO NETITLAN	\$ 300,000.01	\$ 300,000.01	\$ 300,000.01	\$ 300,000.01	\$ 300,000.01	\$ 300,000.01	\$ 300,000.01	100%	100%	ML	516.77	TERMINADA

RECIBIDO
 FIRMAS / CGPSE

SECRETARIA DE BIENESTAR
 MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PUEBLA
 Of. de Planeación, Seguimiento y Evaluación
 Lic. **ROSALBA TELLO AGUILAR** Asistente

13 ENE 2023

\$ 3,000,000.01 = el de
 \$ 300,000.01 = el de

RECIBIDO
 FIRMAS / CGPSE

NOMBRE DEL MUNICIPIO
 FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
 CUARTO TRIMESTRE 2022

FORTAMUN-DF

FOLIO SISTEMA SHCP	No. MIDS	No. DE OBRA	NOMBRE DE OBRA O ACCIÓN	LOCALIDAD	APROBADO	MODIFICADO	MINISTRADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCE FÍSICO	AVANCE FINANCIERO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	NO APLICA	MZP-2022-03	ENERO DE 2022 A DICIEMBRE DE 2022 DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	ZAPOTITLÁN SALINAS	\$ 2,467,251.45	\$ 2,252,615.39	\$ 2,252,615.39	\$ 2,252,615.39	\$ 2,252,615.39	\$ 2,252,615.39	\$ 2,252,615.39	100%	100%	MES	10.00	TERMINADA
PUE220102064348	NO APLICA	MZP-2022-05	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN RAYA, ZAPOTITLÁN, PUEBLA, 2da ETAPA.	SAN JUAN RAYA	\$ 713,078.88	\$ 713,003.20	\$ 713,003.20	\$ 713,003.20	\$ 713,003.20	\$ 713,003.20	\$ 713,003.20	100%	100%	M2	369.50	TERMINADA
PUE220302136258	NO APLICA	MZP-2022-23	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO DE IDENTIDAD, EN ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN, PUEBLA. 2da ETAPA.	ZAPOTITLÁN SALINAS	\$ 757,520.10	\$ 755,560.40	\$ 755,560.40	\$ 755,560.40	\$ 755,560.40	\$ 755,560.40	\$ 755,560.40	100%	100%	M2	346.72	TERMINADA
PUE220302136260	NO APLICA	MZP-2022-18	REHABILITACION DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL VALLE, ZAPOTITLÁN, PUEBLA. 1ra ETAPA.	SAN MARTIN DEL VALLE	\$ 389,971.50	\$ 388,336.36	\$ 388,336.36	\$ 388,336.36	\$ 388,336.36	\$ 388,336.36	\$ 388,336.36	100%	100%	M2	70.18	TERMINADA
PUE220202098468	NO APLICA	MZP-2022-08	CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE LA MESA, ZAPOTITLÁN, PUEBLA, 3ra ETAPA.	GUADALUPE LA MESA	\$ 354,654.92	\$ 353,333.27	\$ 353,333.27	\$ 353,333.27	\$ 353,333.27	\$ 353,333.27	\$ 353,333.27	100%	100%	M2	122.83	TERMINADA
PUE220302136262	NO APLICA	MZP-2022-21	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE OAXACA, ENTRE BARRANCA Y CENTRO DE LA COLONIA ZARAGOZA, ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	COLONIA ZARAGOZA	\$ 401,488.27	\$ 401,116.78	\$ 401,116.78	\$ 401,116.78	\$ 401,116.78	\$ 401,116.78	\$ 401,116.78	100%	100%	ML	338.00	TERMINADA
TMP_PUE220402201097	NO APLICA	MZP-2022-25	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE CRUZ BLANCA Y CALLE CUAUHTEMOC, ZAPOTITLÁN SALINAS, ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	ZAPOTITLÁN SALINAS	\$ 275,313.03	\$ 272,835.33	\$ 272,835.33	\$ 272,835.33	\$ 272,835.33	\$ 272,835.33	\$ 272,835.33	100%	100%	M2	410.47	TERMINADA
TMP_PUE220402201099	NO APLICA	MZP-2022-30	APORTACION AL CERESO DE TEHUACÁN 2022	ZAPOTITLÁN SALINAS	\$ 321,433.45	\$ 321,433.45	\$ 321,433.45	\$ 321,433.45	\$ 321,433.45	\$ 321,433.45	\$ 321,433.45	100%	100%	APORTACION	3.00	TERMINADA
TMP_PUE220402201104	NO APLICA	MZP-2022-31	ADQUISICION DE VEHICULO PARA TRASLADO TIPO AMBULANCIA, PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	ZAPOTITLÁN SALINAS	\$ 515,000.00	\$ 510,000.00	\$ 510,000.00	\$ 510,000.00	\$ 510,000.00	\$ 510,000.00	\$ 510,000.00	100%	100%	UNIDAD DE 1.00	1.00	TERMINADA
	NO APLICA	MZP-2022-31	REVESTIMIENTO DEL CAMINO E.C. TEHUACÁN-HUALUPÁN LOS REYES METZONTLA DEL KM 7+095 AL KM 7+795.00, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA.	LOS REYES METZONTLA	\$ 466,421.78	\$ 463,963.03	\$ 463,963.03	\$ 463,963.03	\$ 463,963.03	\$ 463,963.03	\$ 463,963.03	0%	100%	KM	0.70	EN PROCESO

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Coordinación General de
Gobierno de Puebla
 Planeación, Seguimiento y
 Evaluación
 Asesoria
13 ENE 2023
RECIBIDO
 FOLIO: 2022-03-02-136258

(Handwritten signature)

MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN
FORMATO BASE PARA LA VALIDACION EN EL SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)
INDICADORES 2022

FAIS MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM)
Porcentaje de Otros Proyectos registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador
(Sumatoria de otros proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	2	0.00	0	2	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE EJERCICIO.
	2do. Trimestre	0.00	0	7	0.00	0	3	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE EJERCICIO.
	3er. Trimestre	0.00	0	11	0.00	0	10	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE EJERCICIO.
	4to. Trimestre	0.00	0	15	0.00	0	16	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE EJERCICIO.

Porcentaje de Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS

Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador
(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	0.00	0	2	0.00	0	2	NO SE PLANEARON PROYECTOS DIRECTOS EN ESTE TRIMESTRE.
	2do. Trimestre	57.14	4	7	0.00	0	3	EXISTE UNA VARIACIÓN EN EL INDICADOR, LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
	3er. Trimestre	63.64	7	11	40.00	4	10	EXISTE UNA VARIACIÓN EN EL INDICADOR, LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN VALIDACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS NORMATIVAS.
	4to. Trimestre	66.67	10	15	62.50	10	16	EXISTE UNA VARIACIÓN EN EL INDICADOR, CON LA META PLANEADA POR REPROGRAMACIÓN DE OBRAS A SOLICITUD DE LA POBLACIÓN.

Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS


Método de Cálculo	Periodo	PLANEADO		ALCANZADA		Justificación de Variaciones		
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada		Numerador	Denominador
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/ Sumatorias de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	100.00	2	2	100.00	2	2	META ALCANZADA, EXISTEN DOS OBRAS EN PROCESO 02 Y 04 LAS CUALES NO SE REPORTAN EN DESTINO, YA QUE NO MIGRARON DE LA MIDS.
	2do. Trimestre	42.86	3	7	40.00	3	3	META ALCANZADA
	3er. Trimestre	36.36	4	11	60.00	6	10	META ALCANZADA
	4to. Trimestre	33.33	5	15	37.50	6	16	EXISTE UNA VARIACIÓN EN EL INDICADOR, CON LA META PLANEADA POR REPROGRAMACIÓN DE OBRAS A SOLICITUD DE LA POBLACIÓN.

SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL
COORDINACIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN
GOBIERNO DEL PUEBLO
EVALUACIÓN
14 ENE 2023

RECIBIDO
FIAZ/SIC/CPSE

PRESENTE M. ANGELO
DE ZAPOTITLÁN, PUL.
2021 - 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN)										
Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA		Denominador	Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador			Numerador	Denominador			
(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México) *100	1er. Trimestre	16.67	1071444.89	6428669	16.67	1071444.89	6428669	6428669	RECURSO TRANSFERIDO	
	2do. Trimestre	41.67	2678612.15	6428669	41.67	2678612.15	6428669	6428669	RECURSO TRANSFERIDO	
	3er. Trimestre	66.67	4285779.41	6428669	66.67	4285779.41	6428669	6428669	RECURSO TRANSFERIDO	
	4to. Trimestre	100.00	6428669	6428669	100.00	6428669	6428669	6428669	RECURSO TRANSFERIDO	
Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA		Denominador	Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador			Numerador	Denominador			
((Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN DF)) * 100	1er. Trimestre	100.00	6428669	6428669	100.00	5968234.18	5968234.18	5968234.18	EXISTE UNA OBRA EN PROCESO DE FINQUITO.	
	2do. Trimestre	100.00	6428669	6428669	100.00	5968234.18	5968234.18	5968234.18	EXISTE UNA OBRA EN PROCESO DE FINQUITO.	
	3er. Trimestre	100.00	6428669	6428669	100.00	5968234.18	5968234.18	5968234.18	EXISTE UNA OBRA EN PROCESO DE FINQUITO.	
	4to. Trimestre	100.00	6428669	6428669	100.00	5968234.18	5968234.18	5968234.18	EXISTE UNA OBRA EN PROCESO DE FINQUITO.	
Índice en el Ejercicio de Recursos										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA		Denominador	Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador			Numerador	Denominador			
(Gasto ejercido del FORTAMUN DF por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial)*100	1er. Trimestre	15.19	976801.48	6428669	15.19	976801.48	6428669	6428669	META ALCANZADA	
	2do. Trimestre	41.67	2678612.15	6428669	30.90	1986582.76	6428669	6428669	EXISTE UNA VARIACIÓN EN EL INDICADOR, LOS PROYECTOS SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE VALIDACIÓN.	
	3er. Trimestre	66.67	4285779.41	6428669	57.08	3669434.65	6428669	6428669	EXISTEN PROYECTOS PENDIENTES DE PAGO.	
	4to. Trimestre	100.00	6428669	6428669	92.84	5968256.91	6428669	6428669	EXISTE UNA OBRA EN PROCESO DE FINQUITO.	
Índice de Dependencia Financiera										
Método de Cálculo	Período	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA		Denominador	Justificación de Variaciones	
		Meta Planeada	Numerador			Numerador	Denominador			
(Recursos ministrados del FORTAMUN DF al municipio o demarcación territorial / Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial del Distrito Federal)	2do. Trimestre	21.01	2678612.15	127500	9.68	2678612.15	276813	276813	META ALCANZADA	
	4to. Trimestre	16.35	6428669	393122	11.58	6428669	555,049.50	555,049.50	META ALCANZADA, EXISTIO MAYOR RECALCULACIÓN.	
	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México									
	Método de Cálculo	Período	PLANEADO		Denominador	Meta Alcanzada	ALCANZADA		Denominador	Justificación de Variaciones
Meta Planeada			Numerador	Numerador			Denominador			
(((Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) - 1) * 100	4to Trimestre	5.00	17817897	16969426	-2.33	15186420.4	15549492.64	15549492.64	EXISTE VARIACIÓN YA QUE EL MUNICIPIO RECIBIÓ LAS PARTICIPACIONES EN 2022.	




SECRETARÍA DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, JALISCO
 Presidente Municipal
 SECRETARÍA DE BIENESTAR Social
 Director General de Planeación y Desarrollo Urbano
 SECRETARÍA DE BIENESTAR Social
 Director General de Planeación y Desarrollo Urbano
 13 ENE 2023
 RECIBIDO
 F. M. S. R. F. T.

Modalidad Programa presu Programa Fond Institucion Ejec Rendimiento Fí Reintegr Tipo de Gasto Partida Aprobado Modificado Recaudado(Mit Comprometido Devengado Ejercido Pagado Contratos Proyectos Observaciones

Modalidad	Programa	Presu	Programa	Fond	Institucion	Ejec	Rendimiento	Fí	Reintegr	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado(Mit Comprometido Devengado Ejercido Pagado Contratos Proyectos Observaciones
	4	Fals Municipal	1	6043.04	6043.04									
	5	FORTAMUN DF	1	3550.94	0									
	1	441	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MODULO AL 100% TERMINADO, SE REINTEGRAN LOS INTERESES DE FINANZAS, YA QUE NO FUERON EJERCIDOS.
	2	612	2705640.06	1208581.23	1208581.23	1208581.23	1208581.23	1208581.23	1208581.23	1208581.23	1208581.23	1208581.23	1208581.23	PARTIDA CANCELADA
	2	613	2895146.02	4908137.53	4908137.53	4908137.53	4908137.53	4908137.53	4908137.53	4908137.53	4908137.53	4908137.53	4908137.53	REHABILITACION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO.
	2	614	4629087.92	6113995.24	6113995.24	6113995.24	6113995.24	6113995.24	6113995.24	6113995.24	6113995.24	6113995.24	6113995.24	OBRAS DE AGUA POTABLE Y DRENAJE EN DIFERENTES LOCALIDADES.
	1	311	2467251.45	2252615.39	2252615.39	2252615.39	2252615.39	2252615.39	2252615.39	2252615.39	2252615.39	2252615.39	2252615.39	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN DIFERENTES LOCALIDADES.
	1	358	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MODULO EN PROCESO, EXISTE UNA OBRA EN TRAMITE DE FINIQUITO, LOS INTERESES DE FINANZAS, SE EJERCEN EN LA PARTIDA 615.
	2	541	562085	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	510000	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 2022 DEL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA.
	2	612	1593300.55	1468563.6	1468563.6	1468563.6	1468563.6	1468563.6	1468563.6	1468563.6	1468563.6	1468563.6	1468563.6	APORTACION AL CERESO DE TEHUACAN 2022
	2	622	730000	741669.63	741669.63	741669.63	741669.63	741669.63	741669.63	741669.63	741669.63	741669.63	741669.63	APORTACION DE VEHICULO PARA TRANSLADO TIPO AMBULANCIA, PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA.
	1	853	766032	321433.45	321433.45	321433.45	321433.45	321433.45	321433.45	321433.45	321433.45	321433.45	321433.45	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS: TEJADO EN CANCHA Y PARQUE EN 4 DIFERENTES LOCALIDADES
	2	614	0	673952.11	673952.11	673952.11	673952.11	673952.11	673952.11	673952.11	673952.11	673952.11	673952.11	CONSTRUCCION Y REHAB. DE OFICINAS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN DIFERENTES LOCALIDADES
	2	615	0	463963.03	463963.03	463963.03	463963.03	463963.03	463963.03	463963.03	463963.03	463963.03	463963.03	APORTACION AL CERESO DE TEHUACAN 2022
	1	341	0	22.73	22.73	22.73	22.73	22.73	22.73	22.73	22.73	22.73	22.73	OBRA DE URBANIZACION: GUARNICIONES Y BANQUETAS.
														REVESTIMIENTO DEL CAMINO E.C.TEHUACAN-HUADUPAN LOS REYES MET. CONTILA DEL KM 7+095 AL KM 7+955.00, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLU
														COMISION POR SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS

SECRETARÍA DE BIENESTAR
 Construcción General de
 Cas Poblal Paritad
 Ayuntamiento de Zapotitlan, Puebl
 13 ENE 2023
 RECIBIDO
 FMS/SBIC/CPSE

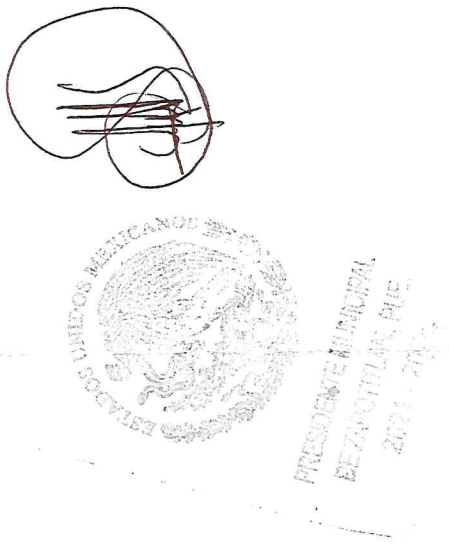

AVANCE FINANCIERO

DETALLE_PROYECTO

JENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES_FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA
lo_recurso:2022, ramo:33, ad1, prog_pres:5, curso:FEDERALES (APORTACIONES, REVESTIMIENTO DEL CAMINO E.C. TEHUACAN-HUAJUPAN-LOS REYES METZONTLA DEL KM 7+095 AL KM 7+795.00, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA		Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Municipio de Zapotitlán	MZP-2022-31	{meta1: (unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:0.7, meta_modificada: 0.7)}	463963.03	463963.03	463963.03	0	0	{meta1: (unidad_medida: Validado / Registrado avances:0.7)}		{obs1: (observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO. EN ESTA OBRA SE EJERCIERON LOS INTERESES DEL MUNICIPIO Y FINANZAS POR 3,528.21, trimestres:4.0, usuario:josepascastillo, fecha:2023-01-13)}
lo_recurso:2022, ramo:33, ad1, prog_pres:4, curso:FEDERALES (APORTACIONES, CALCANTE Y CALLE SAN JUAN EN LA COLONIA EL PEDREGAL EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 208321		Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Zapotitlán	208321	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1015.2, meta_modificada: 1080.0)}	1009854.36	1009854.36	1009854.36	1009854.36	1009854.36	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:1080.0)}		{obs1: (observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO. , trimestre:4.0, usuario:josepascastillo, fecha:2023-01-11)}
lo_recurso:2022, ramo:33, ad1, prog_pres:5, curso:FEDERALES (APORTACIONES, REHABILITACIÓN DE UNIDAD DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN DEL VALLE, ZAPOTITLAN, PUEBLA.1ra ETAPA.		Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Gubernamental	Municipio de Zapotitlán	MZP-2022-18	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:106.34, meta_modificada: 106.34)}	388336.36	388336.36	388336.36	388336.36	388336.36	{meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:106.34)}		Sin observaciones
lo_recurso:2022, ramo:33, ad1, prog_pres:4, curso:FEDERALES (APORTACIONES, EN LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PROLONGACION DE LA CALLE DE LOS DEPORTES DE SAN ANTONIO TEXCALA, ZAPOTITLAN, PUEBLA. - 207560		Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Zapotitlán	207560	{meta1: (unidad_medida:Metros cúbicos, meta:349.59, meta_modificada: 349.59)}	995146.02	995146.02	995146.02	995146.02	995146.02	{meta1: (unidad_medida: Metros cúbicos, avance:349.59)}		{obs1: (observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO. , trimestre:4.0, usuario:josepascastillo, fecha:2023-01-11)}
lo_recurso:2022, ramo:33, ad1, prog_pres:4, curso:FEDERALES (APORTACIONES, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA EL PEDREGAL EN ZAPOTITLAN SALINAS ZAPOTITLAN PUEBLA. - 248562		Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Zapotitlán	248562	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:660.0, meta_modificada: 660.67)}	1296690.45	1296690.45	1296690.45	1296690.45	1296690.45	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:660.67)}		{obs1: (observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO. , trimestre:4.0, usuario:josepascastillo, fecha:2023-01-11)}
lo_recurso:2022, ramo:33, ad1, prog_pres:5, curso:FEDERALES (APORTACIONES, ADQUISICION DE VEHICULO PARA TRASLADO TIPO AMBULANCIA, PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN, PUEBLA.		Zapotitlán	Programa de Inversión de Adquisiciones	Municipio de Zapotitlán	MZP-2022-30	{meta1: (unidad_medida:Vehículos, meta:1.0, meta_modificada: 1.0)}	510000	510000	510000	510000	510000	{meta1: (unidad_medida: Vehículos, avance:1.0)}		{obs1: (observación:UNIDAD ENTREGADA Y EN SERVICIO, trimestre:4.0, usuario:josepascastillo, fecha:2023-01-13)}
lo_recurso:2022, ramo:33, ad1, prog_pres:5, curso:FEDERALES (APORTACIONES, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE OAXACA, ENTRE BARRANCA Y CENTRO DE LA COLONIA ZARAGOZA, ZAPOTITLAN, PUEBLA.		Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Zapotitlán	MZP-2022-30	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:520.0, meta_modificada: 520.0)}	401116.78	401116.78	401116.78	401116.78	401116.78	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:520.0)}		{obs1: (observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:4.0, usuario:josepascastillo, fecha:2023-01-11)}
lo_recurso:2022, ramo:33, ad1, prog_pres:4, curso:FEDERALES (APORTACIONES, ENTUBADA EN CALLE NACIONAL ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE SIN NOMBRE EN SAN FRANCISCO XOCHILTEPEC ZAPOTITLAN PUEBLA. 710002.49, -151877		Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Zapotitlán	MZP-2022-30	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1182.62, meta_modificada: 1182.62)}	710002.49	710002.49	710002.49	710002.49	710002.49	{meta1: (unidad_medida: Metros lineales, avance:1182.62)}		{obs1: (observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:4.0, usuario:josepascastillo, fecha:2023-01-11)}



DESTINO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2022

AVANCE FINANCIERO

DETALLE PROYECTO

FUENTES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
clo_recurso:2022, ramo:33, fact1, prog_pres:4, curso:FEDERALES (APORTACIONES, CALLE DEL PANTON ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CAZAHUATERA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS	CONSTRUCCION DE ADOQUINAMIENTO EN LA CALLE DEL PANTON ENTRE AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE CAZAHUATERA EN LA LOCALIDAD DE ZAPOTITLAN SALINAS PRIMERA ETAPA - 207665	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Zapotitlán	207665	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.66, meta_modificada: 758.66)}	903896.24	903896.24	903896.24	903896.24	903896.24	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:758.66)}	Validado avances	{obs1: (observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:4, usuario:josaeastillo, fecha:2023-01-11)}
clo_recurso:2022, ramo:33, fact1, prog_pres:4, curso:FEDERALES (APORTACIONES, REHABILITACION DEL SISTEMA Y TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LAS VENTAS ZAPOTITLAN PUEBLA PRIMERA ETAPA - 163725	REHABILITACION DEL SISTEMA Y TANQUE DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE COLONIA LAS VENTAS ZAPOTITLAN PUEBLA PRIMERA ETAPA - 163725	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Zapotitlán	163725	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0, meta_modificada: 22.0)}	320754.34	320754.34	320754.34	320754.34	320754.34	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:28.0)}	Validado avances	{obs1: (observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:4, usuario:josaeastillo, fecha:2023-01-11)}
clo_recurso:2022, ramo:33, fact1, prog_pres:4, curso:FEDERALES (APORTACIONES, CONSTRUCCION DEL SISTEMA Y TANQUE DE AGUA ENTUBADA DE 20 M3 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DIXIADO ZAPOTITLAN PUEBLA PRIMERA ETAPA - 208387	CONSTRUCCION DEL SISTEMA Y TANQUE DE AGUA ENTUBADA DE 20 M3 EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DIXIADO ZAPOTITLAN PUEBLA PRIMERA ETAPA - 208387	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Zapotitlán	208387	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.21, meta_modificada: 22.0)}	344060.1	344060.1	344060.1	344060.1	344060.1	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:37.21)}	Validado avances	{obs1: (observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:4, usuario:josaeastillo, fecha:2023-01-11)}
clo_recurso:2022, ramo:33, fact1, prog_pres:5, curso:FEDERALES (APORTACIONES, CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE CRUZ BLANCA Y CALLE CUAHUTEMOC, ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA. ADO:272835.33}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA AVENIDA ADOLFO LOPEZ MATEOS ENTRE CALLE CRUZ BLANCA Y CALLE CUAHUTEMOC, ZAPOTITLAN SALINAS, ZAPOTITLAN, PUEBLA. ADO:272835.33}	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica	Municipio de Zapotitlán	MZP-2022-25	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.47, meta_modificada: 410.47)}	272835.33	272835.33	272835.33	272835.33	272835.33	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:410.47)}	Validado / Registrado avances	{obs1: (observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:4, usuario:josaeastillo, fecha:2023-01-11)}
clo_recurso:2022, ramo:33, fact1, prog_pres:4, curso:FEDERALES (APORTACIONES, CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES METZONTLA MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PUEBLA - 149600	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORATIVO EN LA LOCALIDAD DE LOS REYES METZONTLA MUNICIPIO DE ZAPOTITLAN PUEBLA - 149600	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Zapotitlán	149600	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.6, meta_modificada: 482.49)}	1208581.23	1208581.23	1208581.23	1208581.23	1208581.23	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:418.6)}	Validado avances	{obs1: (observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:4, usuario:josaeastillo, fecha:2023-01-11)}
clo_recurso:2022, ramo:33, fact1, prog_pres:4, curso:FEDERALES (APORTACIONES, CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ESTANZUELA, ZAPOTITLAN, PUEBLA - 223643	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN LA LOCALIDAD DE ESTANZUELA, ZAPOTITLAN, PUEBLA - 223643	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Zapotitlán	223643	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada: 800.0)}	330270.9	330270.9	330270.9	330270.9	330270.9	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0)}	Validado avances	{obs1: (observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:4, usuario:josaeastillo, fecha:2023-01-11)}
clo_recurso:2022, ramo:33, fact1, prog_pres:4, curso:FEDERALES (APORTACIONES, LA PROLONGACION DE LA CALLE FRESNOS ENTRE CALLE FRESNOS Y CARRETERA ATECOXCO SAN PEDRO ATZUMBA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NETITLAN ZAPOTITLAN, PUEBLA - 262493	LA PROLONGACION DE LA CALLE FRESNOS ENTRE CALLE FRESNOS Y CARRETERA ATECOXCO SAN PEDRO ATZUMBA EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO NETITLAN ZAPOTITLAN, PUEBLA - 262493	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Zapotitlán	262493	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:516.77, meta_modificada: 516.77)}	300000.01	300000.01	300000.01	300000.01	300000.01	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:516.77)}	Validado avances	{obs1: (observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:4, usuario:josaeastillo, fecha:2023-01-11)}



AVANCE FINANCIERO

UNIDADES FINANCIAMIENTO	NOMBRE	MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	METAS	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	AVANCES FISICOS	FLUJO	OBSERVACIONES CAPTURISTA
-------------------------	--------	-----------------------	------------------------	-----------------------	-----------------	-------	-----------	--------------	-----------	----------	--------	-----------------	-------	--------------------------

dlo_recurso:2022, ramo:33, jaci1, prog_pres:5, curso:FEDERALES (APORTACIONES, CONSTRUCCION DE PARQUE PÚBLICO DE IDENTIDAD, EN ZAPOTITLÁN SALINAS, IOS Y CONVENIOS), 755560.4, modificado:755560.4}}	ZAPOTITLÁN, PUEBLA. 2da ETAPA.	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Zapotitlán	MZP-2022-23 525.33}}	(meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:525.33, meta_modificada: 525.33}}	755560.4	755560.4	755560.4	755560.4	755560.4	(meta1: (unidad_medida: Metros Cuadrados, avance:525.33}}	Validado avances	(obs1: (observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:4.0, usuario:joaeseastillero, fecha:2023-01-11}}
dlo_recurso:2022, ramo:33, jaci1, prog_pres:4, curso:FEDERALES (APORTACIONES, ALMACENAMIENTO DE 30 M3 EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO NETITLÁN, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTITLÁN, PUEBLA. - 262182	Zapotitlán	Zapotitlán	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio de Zapotitlán	262182	(meta1: (unidad_medida: Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada: 1.0}}	302110.72	302110.72	302110.72	302110.72	302110.72	(meta1: (unidad_medida: Tanque(s), avance:1.0}}	Validado avances	(obs1: (observación:OBRA TERMINADA Y OPERANDO, trimestre:4.0, usuario:joaeseastillero, fecha:2023-01-11}}



EJERCICIO DEL GASTO CUARTO TRIMESTRE 2022

le so	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convenio - Específico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Y j)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN DF 4 TRIM	Municipio de Zapotitlán			1 - Gasto corriente	358 - Servicios de limpieza y manejo de residuos	310000	0	0	0	0	0	Validado	APORTACION AL CERESO DE TEHUACAN 2022
Y j)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN DF 4 TRIM	Municipio de Zapotitlán			1 - Gasto corriente	311 - Energía eléctrica	2467251.45	2252615.39	2252615.39	2252615.39	2252615.39	2252615.39	Validado	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA 2022 DEL MUNICIPIO DE ZAPOTTILAN, PUEBLA.
Y j)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN DF 4 TRIM	Municipio de Zapotitlán			2 - Gasto de Inversión	541 - Vehículos y Equipo Terrestre	562085	510000	510000	510000	510000	510000	Validado	ADQUISICION DE VEHICULO PARA TRASELADO TIPO AMBULANCIA, PARA EL MUNICIPIO DE ZAPOTTILAN, PUEBLA.
Y j)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN DF 4 TRIM	Municipio de Zapotitlán			2 - Gasto de Inversión	622 - Edificación no habitacional	730000	741669.63	741669.63	741669.63	741669.63	741669.63	Validado	CONSTRUCCION Y REHAB. DE OFICINAS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EN DIFERENTES LOCALIDADES
Y j)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN DF 4 TRIM	Municipio de Zapotitlán			1 - Gasto corriente	853 - Otros convenios	766032	321433.45	321433.45	321433.45	321433.45	321433.45	Validado	APORTACION AL CERESO DE TEHUACAN 2022
Y j)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN DF 4 TRIM	Municipio de Zapotitlán			2 - Gasto de Inversión	615 - Construcción de vías de comunicación	0	463963.03	463963.03	463963.03	0	0	Validado	REVESTIMIENTO DEL CAMINO E.C. TEHUACAN-HUAJAPAN- LOS REYES METZONTLA DEL KM 7+095 AL KM 7+795.00, EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTTILAN, PUEBLA. EN ESTA OBRA SE EIEREN LOS INTERESES.
Y j)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FORTAMUN	1005	FORTAMUN DF 4 TRIM	Municipio de Zapotitlán			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	1593300.55	1468563.6	1468563.6	1468563.6	1468563.6	1468563.6	Validado	CONSTRUCCION DE ESPACIOS PUBLICOS, TECHADO EN CANCHA Y PARQUE EN DIFERENTES LOCALIDADES



INDICADORES CUARTO TRIMESTRE 2022

Nombre del Programa Presupuestario	Grupo Funcional	Clave del Indicador	Nombre del Indicador	Método de Cálculo	Nivel del Indicador	Frecuencia de Medición	Unidad de Medida	Tipo	Dimensión del Indicador	Sentido	Meta programada	Justificación	Detalle	Realizado en el Periodo	Justificación	Detalle	Avance (%)	Flujo
Demarcaciones territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	169354	Porcentaje de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre	(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre *100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	33.33333	{Just1:[dd]de:2022,ri m=4,Just:Otras causas,usuario:Jose castilloco,[fecha:11/01/23]}		37.5	Otras causas	EXISTE UNA VARIACIÓN EN EL INDICADOR, CON LA META PLANEADA POR REPROGRAMACIÓN DE OBRAS A SOLICITUD DE LA POBLACIÓN.	106.67	Validado
			Complementarios registrados en la MIDS			40												
Demarcaciones territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	169772	Porcentaje de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS	(Sumatoria de proyectos de contribución directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre *100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	66.66667	{Just1:[dd]de:2022,ri m=4,Just:Otras causas,usuario:Jose castilloco,[fecha:11/01/23]}		62.5	Otras causas	EXISTE UNA VARIACIÓN EN EL INDICADOR, CON LA META PLANEADA POR REPROGRAMACIÓN DE OBRAS A SOLICITUD DE LA POBLACIÓN.	104.17	Validado
			Proyectos de contribución directa registrados en la MIDS			60												
Demarcaciones territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	170586	Porcentaje de otros proyectos registrados en la MIDS	(Sumatoria de otros proyectos registrados la MIDS al trimestre correspondiente)/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Descendente	0	{Just1:[dd]de:2022,ri m=4,Just:Otras causas,usuario:Jose castilloco,[fecha:11/01/23]}		0	Otras causas	NO SE PLANEARON OTROS PROYECTOS EN ESTE EJERCICIO.	100	Validado
			Proyectos registrados en la MIDS			0												
Demarcaciones territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	173169	Tasa de variación del ingreso disponible del municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México	[(Ingreso disponible municipal o de la demarcación territorial de la Ciudad de México en el año t / Ingreso disponible municipal o demarcación territorial de la Ciudad de México del año t-1) - 1]*100	Propósito	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	5	{Just1:[dd]de:2022,ri m=4,Just:Otras causas,usuario:Jose castilloco,[fecha:11/01/23]}		-2.33494	Otras causas	EXISTE VARIACIÓN, YA QUE EL MUNICIPIO RECIBIO MENOS PARTICIPACIONES EN 2022.	-46.7	Validado
			Ciudad de México			5												
Demarcaciones territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	174145	Índice en el Ejercicio de Recursos	(Gasto ejercido del FORTAMUN por el municipio o demarcación territorial / Monto anual aprobado del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial)*100	Actividad	Trimestral	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	100	{Just1:[dd]de:2022,ri m=4,Just:Otras causas,usuario:Jose castilloco,[fecha:11/01/23]}		92.83814	Otras causas	EXISTE UNA OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.	92.84	Validado
			Recursos			100												
Demarcaciones territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	174452	Índice de Dependencia Financiera	(Recursos ministrados del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial/Ingresos propios registrados por el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)	Propósito	Semestral	Otra	Estratégico	Eficiencia	Descendente	16.35286	{Just1:[dd]de:2022,ri m=4,Just:Otras causas,usuario:Jose castilloco,[fecha:24/01/23]}		11.58216	Otras causas	META ALCANZADA, EXISTIO MAYOR RECAUDACIÓN.	141.19	Validado
			Financiera			16.35286												
Demarcaciones territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	174458	Índice de Aplicación Prioritaria de Recursos	(Gasto ejercido en Obligaciones Financieras + Gasto ejercido en Pago por Derechos de Agua + Gasto ejercido en Seguridad Pública + Gasto ejercido en Inversión) / (Gasto total ejercido del FORTAMUN) * 100	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	100	{Just1:[dd]de:2022,ri m=4,Just:Programadón original deficiente,usuario:Jose castilloco,[fecha:11/01/23]}		100	Otras causas	EXISTE UNA OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO.	100	Validado
			Recursos			100												
Demarcaciones territoriales del Distrito Federal	2 - Desarrollo Social	174459	Porcentaje de recursos FORTAMUN recibidos por municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México	(Recursos transferidos del FORTAMUN al municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México/ Monto anual aprobado del FORTAMUN en el municipio o demarcación territorial de la Ciudad de México)*100	Componente	Anual	Porcentaje	Estratégico	Eficiencia	Ascendente	100	{Just1:[dd]de:2022,ri m=4,Just:Programadón original deficiente,usuario:Jose castilloco,[fecha:11/01/23]}		100	Otras causas	RECURSO TRANSFERIDO	100	Validado
			Ciudad de México			100												

